



POSTUP TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 1:250

FÁZE 1

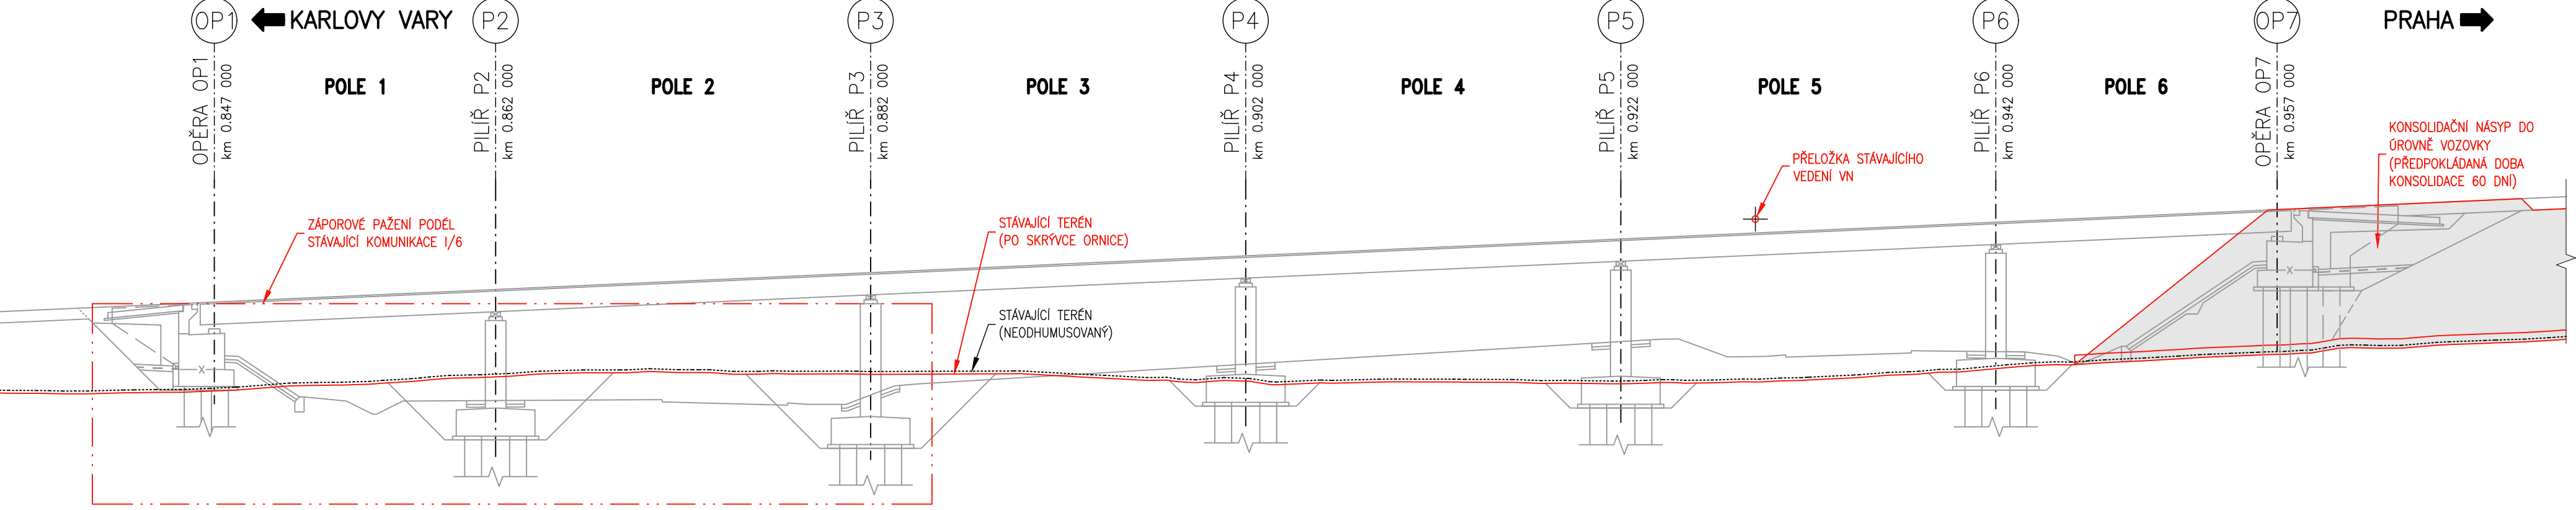


- POSTUP PRACÍ:
- PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH IS
  - ODHUMUSOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
  - VYZTUŽENÉ NÁSTYPY PRO VĚTVE 2, 3 A OK MOK
  - V km 0,900 (S0 105.1, 105.2)
  - KONSOLIDAČNÍ NÁSTYP OPĚRY OP7
  - REALIZACE PROVOZOVNÍHO ZAPOROVÉHO PÁŽENÍ
  - PODEL STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 1/6
  - DOPRAVA JE VEDENA PO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI 1/6.

FÁZE 2

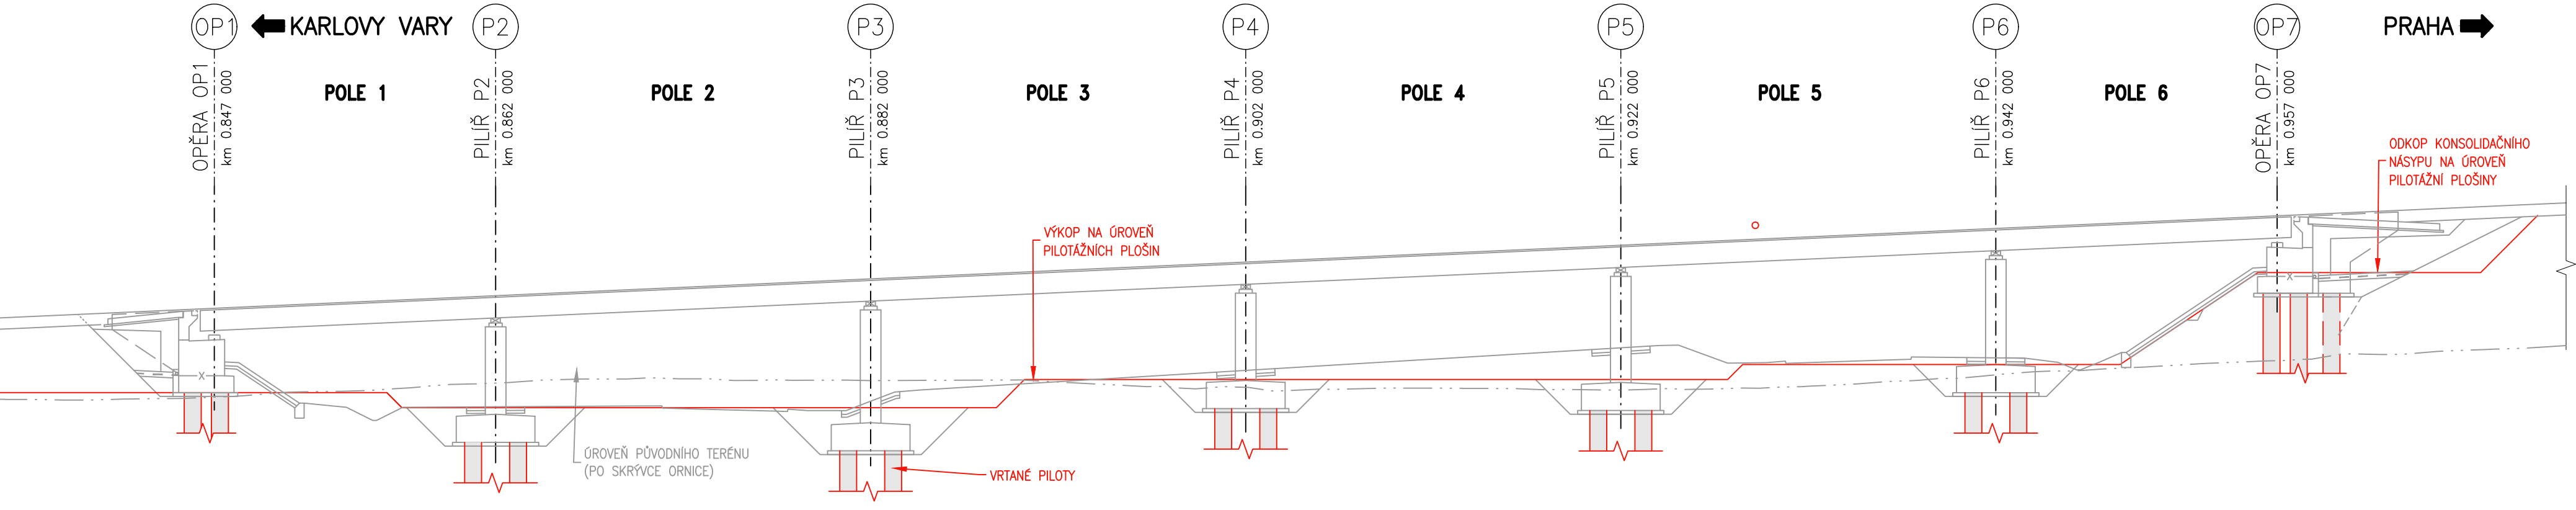


- POSTUP PRACÍ:
- VÝKOP NA GROVEŇ PILOTAŽNÍCH PLOŠIN
  - OKOP KONSOLIDAČNÍHO NÁSTYPU OP7 NA GROVEŇ PILOTAŽNÍCH PLOŠIN
  - REALIZACE PILOTOVÉHO ZALOŽENÍ
  - DOPRAVA JE VEDENA PO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI 1/6.

FÁZE 3

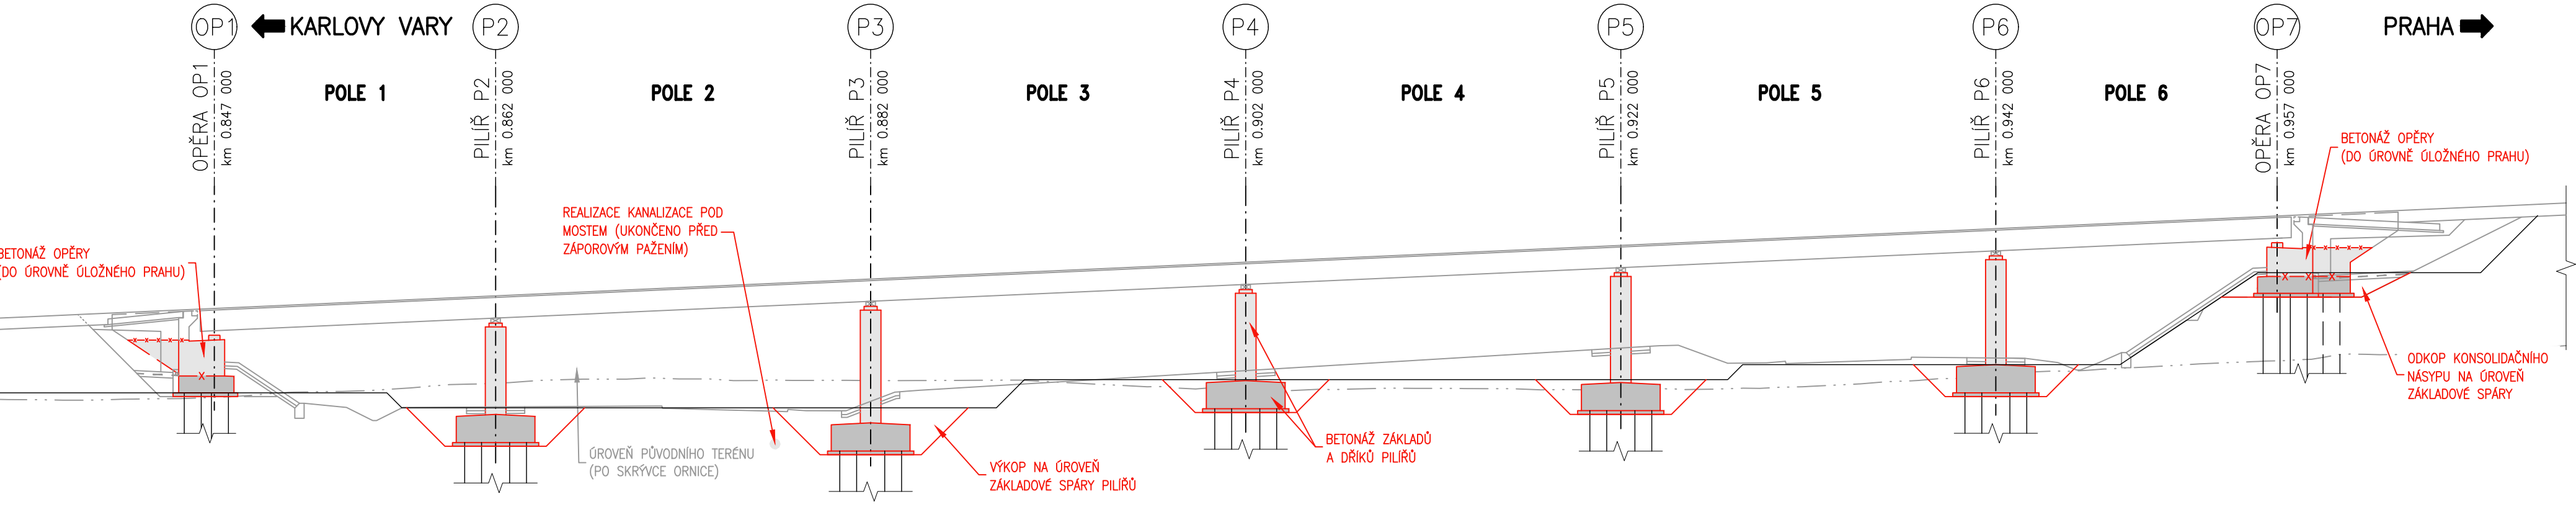

- POSTUP PRACÍ:
- VÝKOP NA GROVEŇ ZAKLADOVÉ SPÁRY A ZAPRAVENÍ HLAV PILOT
  - REALIZACE MOSTNÍCH OPĚR (PO GROVEŇ GLOŽNÉHO PRAHU)
  - REALIZACE MOSTNÍCH PILÍŘŮ
  - REALIZACE KANALIZACE POD MOSTEM (UKONČENO PŘED ZAPOROVÝM PÁŽENÍM)
  - DOPRAVA JE VEDENA PO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI 1/6.


FÁZE 4

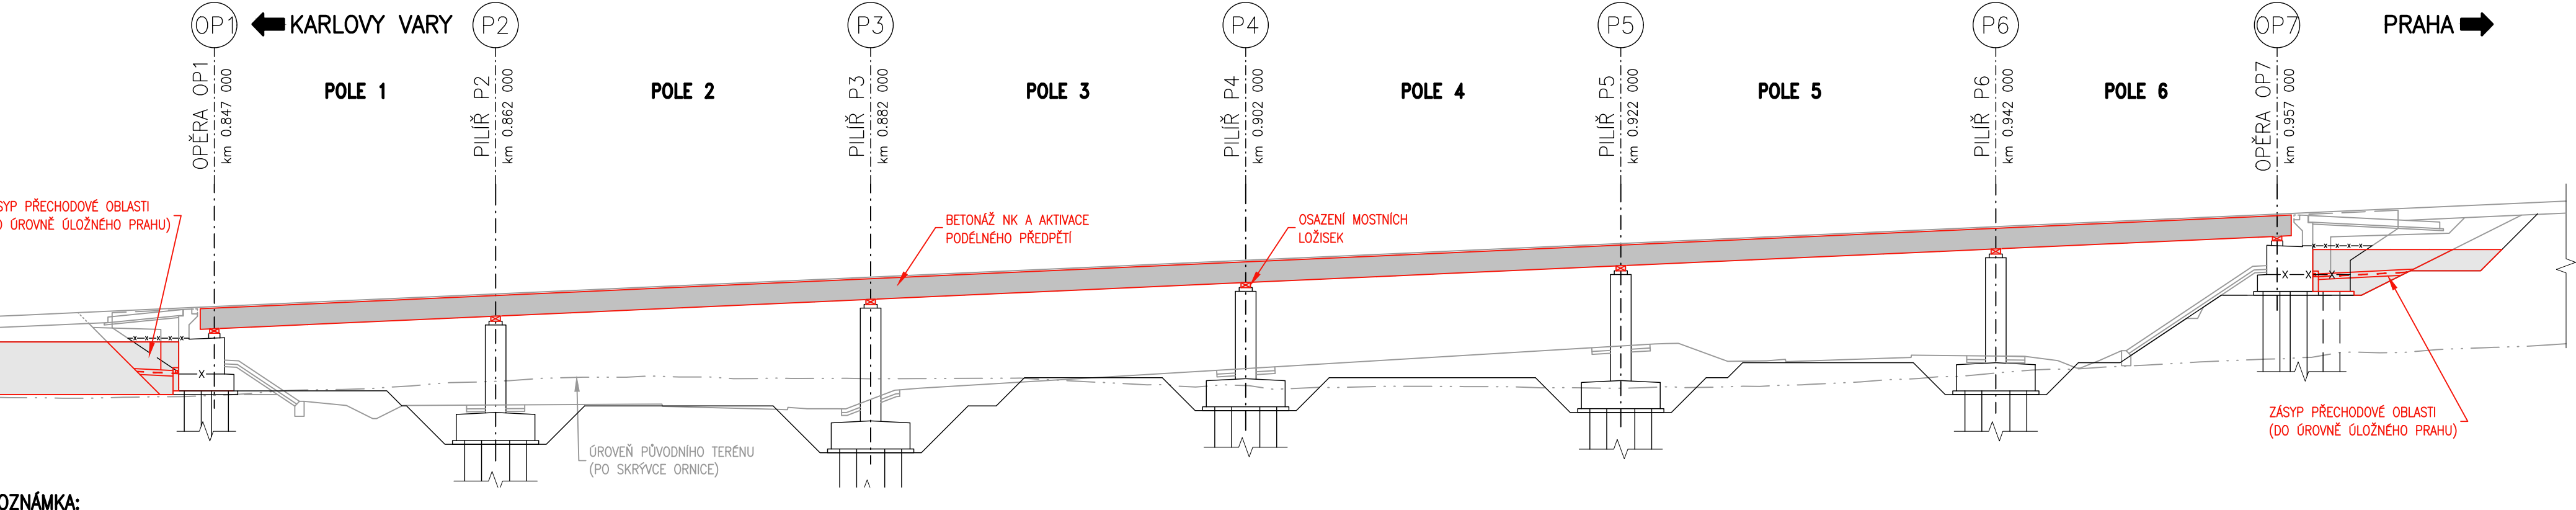

- POSTUP PRACÍ:
- OSAZENÍ MOSTNÍCH LOŽISEK
  - ZASYP PŘECHODOVÉ OBLASTI (DO GROVNÉ GLOŽNÉHO PRAHU)
  - BETONÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ AKTIVACE PODELNÉHO PŘEDPĚTÍ (PŘEDPOKLAD BETONÁŽE NA PEVNÉ SKRŽI V JEDNÉ ETAPĚ)
  - DOPRAVA JE VEDENA PO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI 1/6.


POZNÁMKA:  
V MÍSTECH PŘIDOPRNÉ SKRŽI PRO VÝSTAVBU NK MOSTU SE NEPŘEDPOKLADÁ ŽÁDNÝCH ŽÁDNÝCH KOMUNIKACÍ PRO STAVĚNÍŠNÍ DOPRAVU ANI PROVOZOVNÍCH KOMUNIKACÍ PRO VEDENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY (VIZ TAKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ČÁST B DOKUMENTACE POPS). K BUDOVÁNÍ NK BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP Z BOKU LEVÉHO MOSTU A V PROSTORU OPĚR TĚŽ Z POVrchu STÁVAJÍCÍ SILNICE 1/6, RESP. Z PROSTORU NOVÉ BUDOVANÝCH SOUČÁSTI SILNICE 1/6.

FÁZE 5

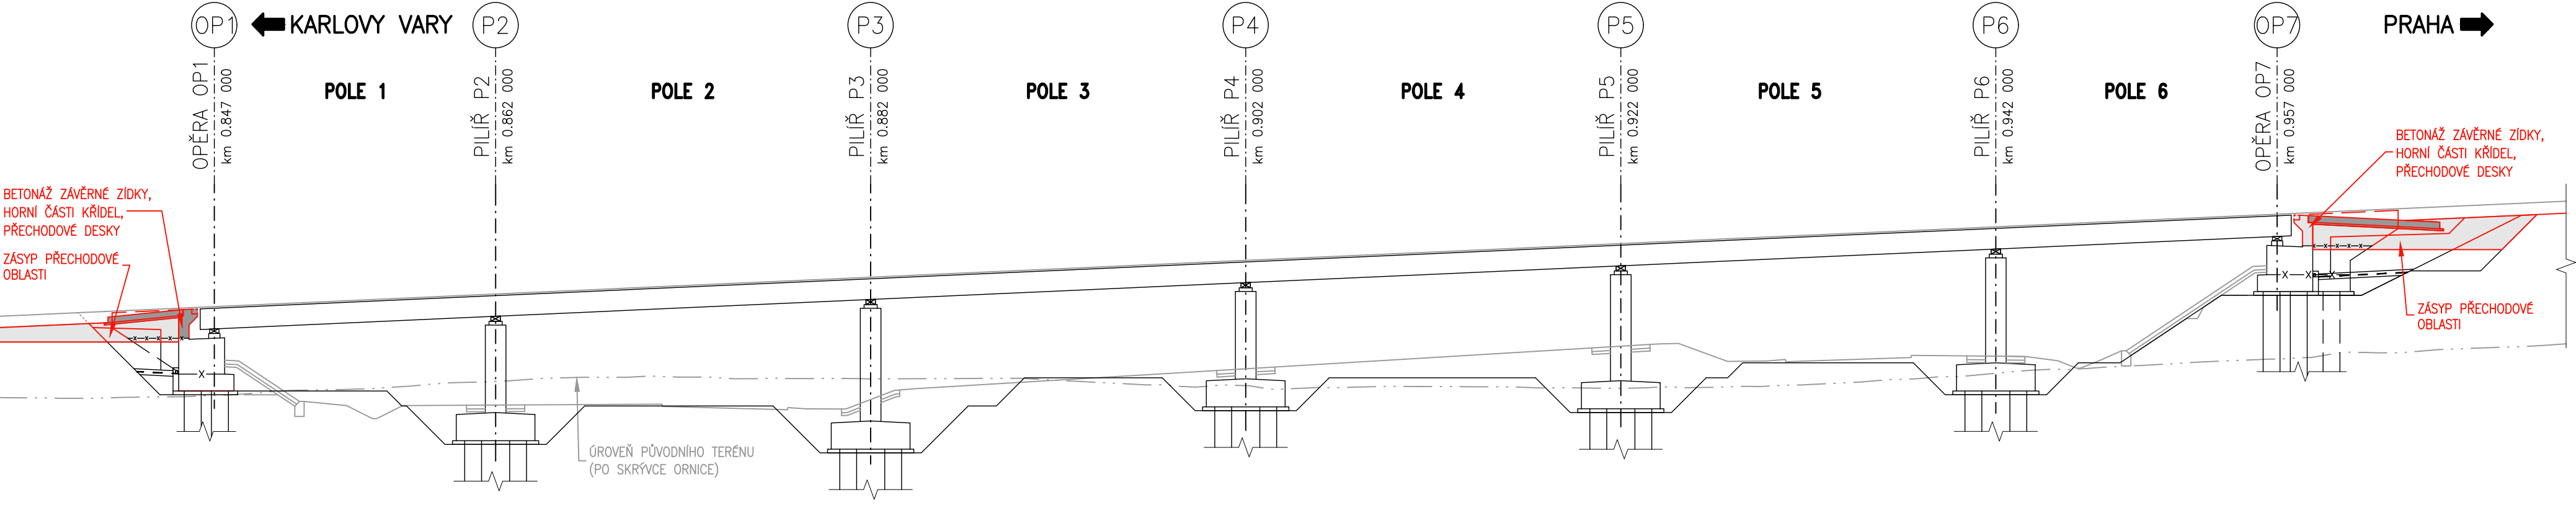


- POSTUP PRACÍ:
- BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ŽIDKY, HORNÍ ČÁSTI KŘÍDEL, PŘECHODOVÉ DESKY
  - DOKONČENÍ ZASYPU PŘECHODOVÉ OBLASTI
  - BETONÁŽ PŘECHODOVÝCH DESEK
  - DOPRAVA JE VEDENA PO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI 1/6.

FÁZE 6

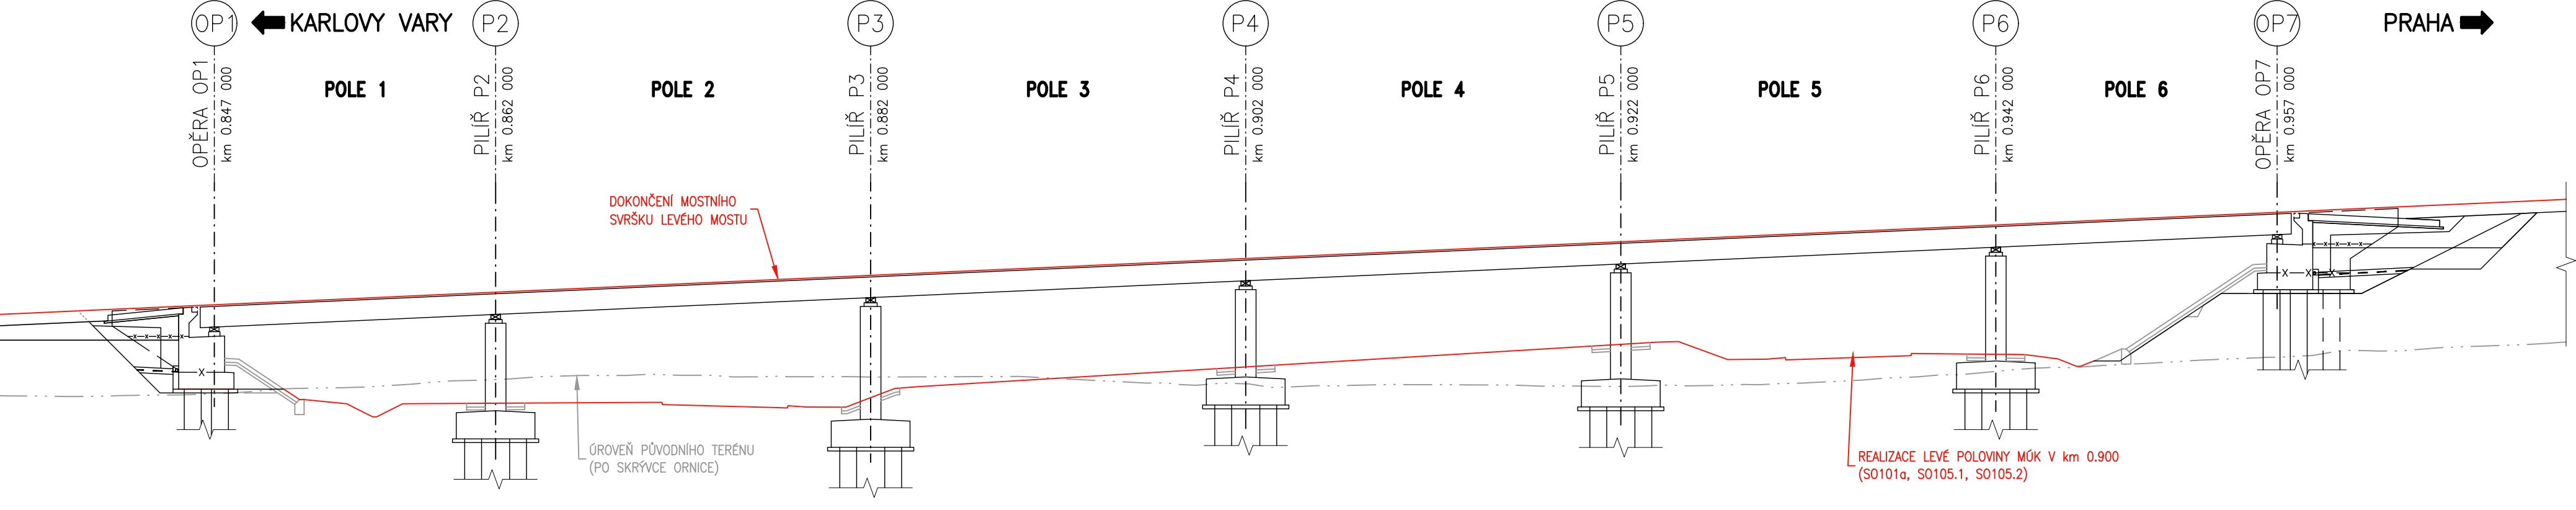

- POSTUP PRACÍ:
- MOSTNÍ SVRŠEK LEVÉHO MOSTU
  - REALIZACE MOK V km 0,900 (S0101a, 105.1, 105.2) MIN. V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO ZPŘEVODNĚNÍ MOSTU NA HLAVNÍ TRASE, VĚTVÍCH 3, 4 A OK
  - PO DOKONČENÍ MOSTNÍHO SVRŠKU LEVÉHO MOSTU JE DOPRAVA SVEDENA NA LEVÝ MOST.

FÁZE 7

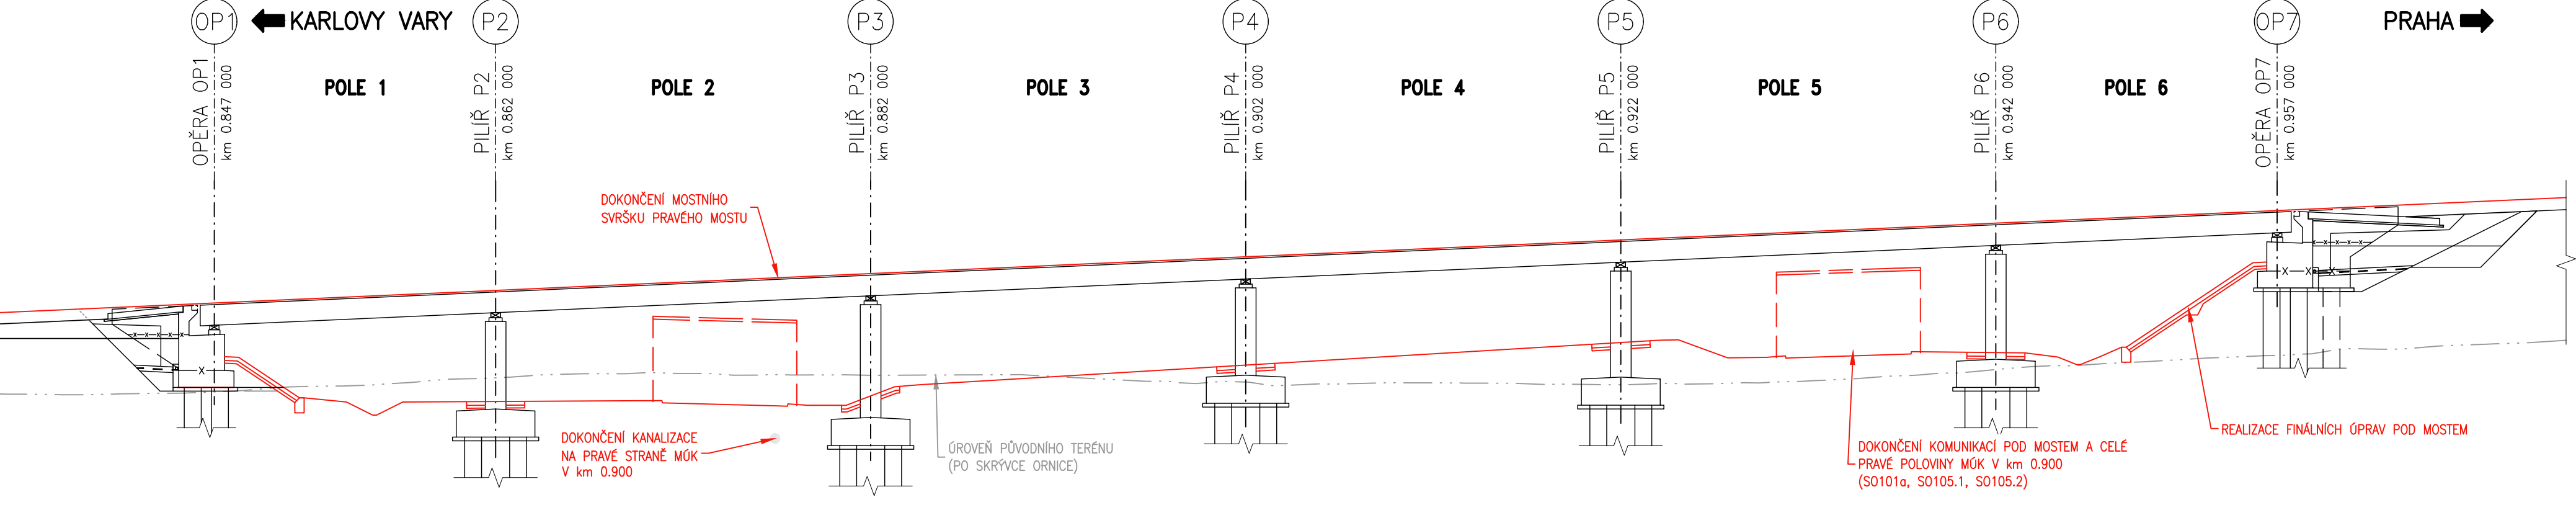

- POSTUP PRACÍ:
- MOSTNÍ SVRŠEK PRAVÉHO MOSTU
  - DOKONČENÍ KOMUNIKACI POD MOSTEM A CELE PRAVÉ POLOVINY MOK V km 0,900
  - DOKONČENÍ ZPEVNĚNÍ PVRCHO POD MOSTEM
  - DOKONČENÍ KANALIZACE NA PRAVÉ STRANĚ MOK V km 0,900
  - DOKONČOVACÍ PRÁCE
  - UVEDENÍ MOSTU DO PROVOZU

D PDPS

|            |                                                                                                                                                 |                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| OBJEDNATEL | ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.<br>ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4<br>STAVBU ZAJIŠTJUJE:<br>SPRÁVA KARLOVÝ VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY | ŘEDITELSTVÍ<br>SILNIC<br>A DÁLNIC |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZHOTOVITEL | Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023<br>VIAPONT s.r.o., VODNÍ 13, 602 00 BRNO | ČLENOVÉ SDRUŽENÍ:<br>Strasky, Husy a partneři s.r.o.<br>SHB, akciová společnost<br>DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>G-Consult, spol. s r.o.<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>METROPROJEKT Praha a.s. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                         |                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT       | VIAPONT s.r.o.<br>VODNÍ 13, 602 00 BRNO | VIAPONT<br>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ<br>VODNÍ 13, 602 00 BRNO |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. IVO FISCHER                        | ČÍSLO ZAKÁZKY 2550-01                                               |

D.1.2.1 SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900

|                       |                                |              |                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT    | ING. IVAN KUŠÁK                |              | VIAPONT<br>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ<br>VODNÍ 13, 602 00 BRNO |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. JAN MACÁK                 |              |                                                                     |
| VYPRACOVAL            | ING. JAN MACÁK                 |              |                                                                     |
| KONTROLOVAL           | ING. IVAN KUŠÁK                |              |                                                                     |
| KRAJ:                 | KARLOVARSKÝ                    | OBEC:        | KARLOVY VARY, ANDELSKÁ HORA                                         |
| NÁZEV STAVBY:         | D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA |              |                                                                     |
| NÁZEV PŘÍLOHY:        | POSTUP TECHNOLOGIE VÝSTAVBY    |              |                                                                     |
|                       |                                | STUPEŇ       | PDPS                                                                |
|                       |                                | DATUM        | ŘÍJEN 2025                                                          |
|                       |                                | FORMÁT       | 12 A4                                                               |
|                       |                                | MĚRÍTKO      | 1:250                                                               |
|                       |                                | Č. ZAKÁZKY   | 2550-01                                                             |
|                       |                                | ARCHIVNÍ Č.  |                                                                     |
|                       |                                | Č. SOUPRAVY: | Č. PŘÍLOHY:                                                         |
|                       |                                |              | 27                                                                  |
