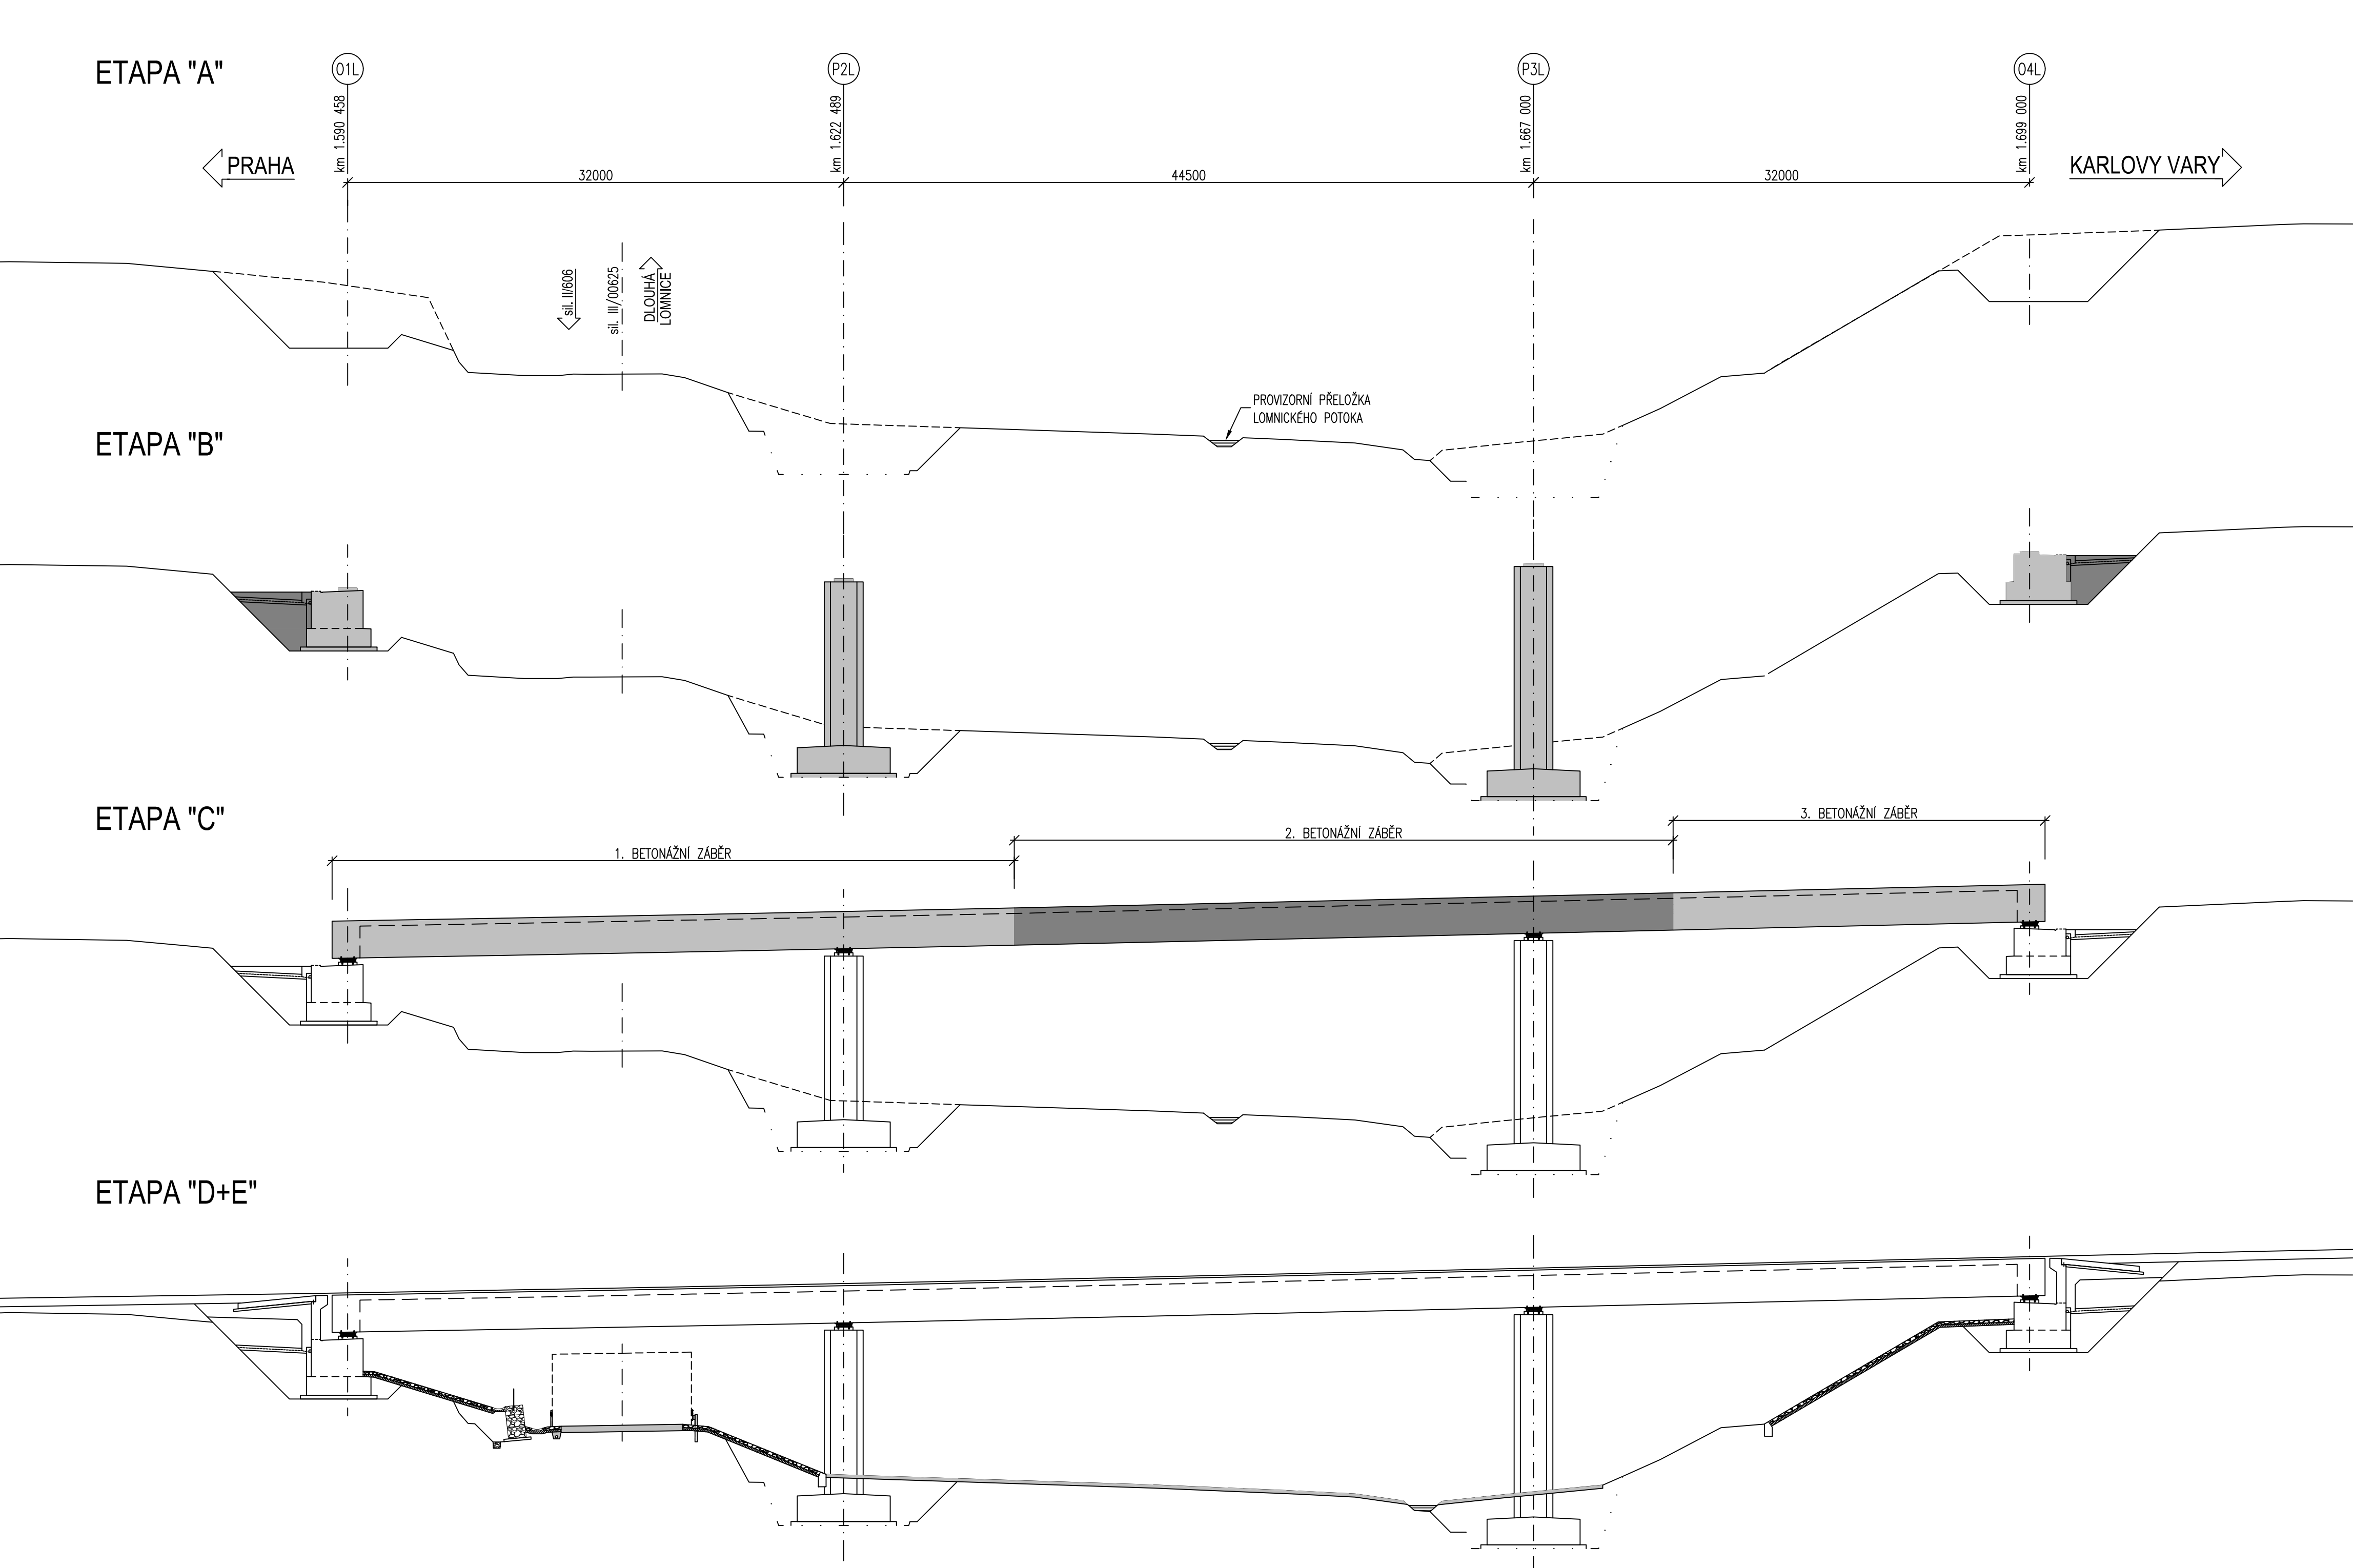


POZNÁMKY:

- NĚJDŘÍV SE POSTAVÍ LEVÝ MOST, PŘITOM PROVOZ NA STÁV. SIL. I/6 BUDE ZACHOVÁN. MEZI NOVÝM A STÁVAJÍCÍM MOSTEM BUDE OSAZENO PAŽENÍ TAM, KDE SE ZASAHUJE VÝKOPEM DO STÁVAJÍCÍHO TĚLESA SILNICE I/6.
- PO DOKONČENÍ VÝSTAVBY LEVÉHO MOSTU SE NA NĚJ PROVOZ SIL. I/6 PŘEVEDE.
- NÁSLEDNĚ SE POSTAVÍ PRÁVÝ MOST
- PROVOZ SIL. I/6 (D6) SE PŘEVEDE NA OBA MOSTY4
- PROVOZ NA SIL. III/00625 BUDE PO DOBU VÝSTAVBY OBOU MOSTŮ ZACHOVÁN. (S VÝJIMKOU VÝLUK NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU)

POSTUP VÝSTAVBY:

- ÚPRAVA TERÉNU PRO POJEZD TĚŽKÉ TECHNIKY + VÝKOPY
- POSTUPNÁ BETONÁŽ OPĚR A PILÍŘŮ, DOSYPÁNÍ PŘECHOD OBLASTI DO ÚROVNĚ OLOŽNÝCH PRAHŮ
- OSAZENÍ LOŽISEK, POSTUPNÁ BETONÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE NA PEVNÉ SKRUŽI VE TŘECH BETONÁŽNÍCH ZABĚRECH
- PO UKONČENÍ VÝSTAVBY NOSNÉ KONSTRUKCE SE DOKONČÍ ZÁVĚR. ZIDKY, PŘECHOD. DESEK
- DOKONČÍ SE MOSTNÍ SVRŠEK, VYBAVENÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
MOST SE UVEDE DO PROVOZU
- POSTUP VÝSTAVBY PLATÍ RÁMCOVĚ PRO OBA MOSTY.

ČÁST D.2

SO 202

ČISTOPIS

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čertánská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kif54			
Namý/vypracoval: Ing. Karolína Hledová podpis: <i>K. Hledová</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Martin BLATSKÝ podpis: <i>M. Blatský</i>	Zástupce zodpovědného projektanta: Ing. Jan BAZIL podpis: <i>J. Bazil</i>	
Technická kontrola: Ing. Kamel PEČHAL podpis: <i>K. Pechal</i>	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel SLAPA podpis: <i>P. Slapa</i>	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan STANKOVEN podpis: <i>R. Stankoven</i>	

Kraj:	KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	25-150-2
Místo stavby:	OLŠOVÁ VRATA, ANDELSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV	Číslo akce:	05-219
Objednatel:	ŘSD s. p., Čertánská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390	Datum:	03/2026
Název stavby:			
D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS		Formát:	
Objekt:	Most na D6 přes Lomnický potok v km 1,600 SO 101	Stupeň:	
Příloha:	SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY		
		Číslo přílohy:	22
